


## POSTUP VÝSTAVBY - I. ETAPA







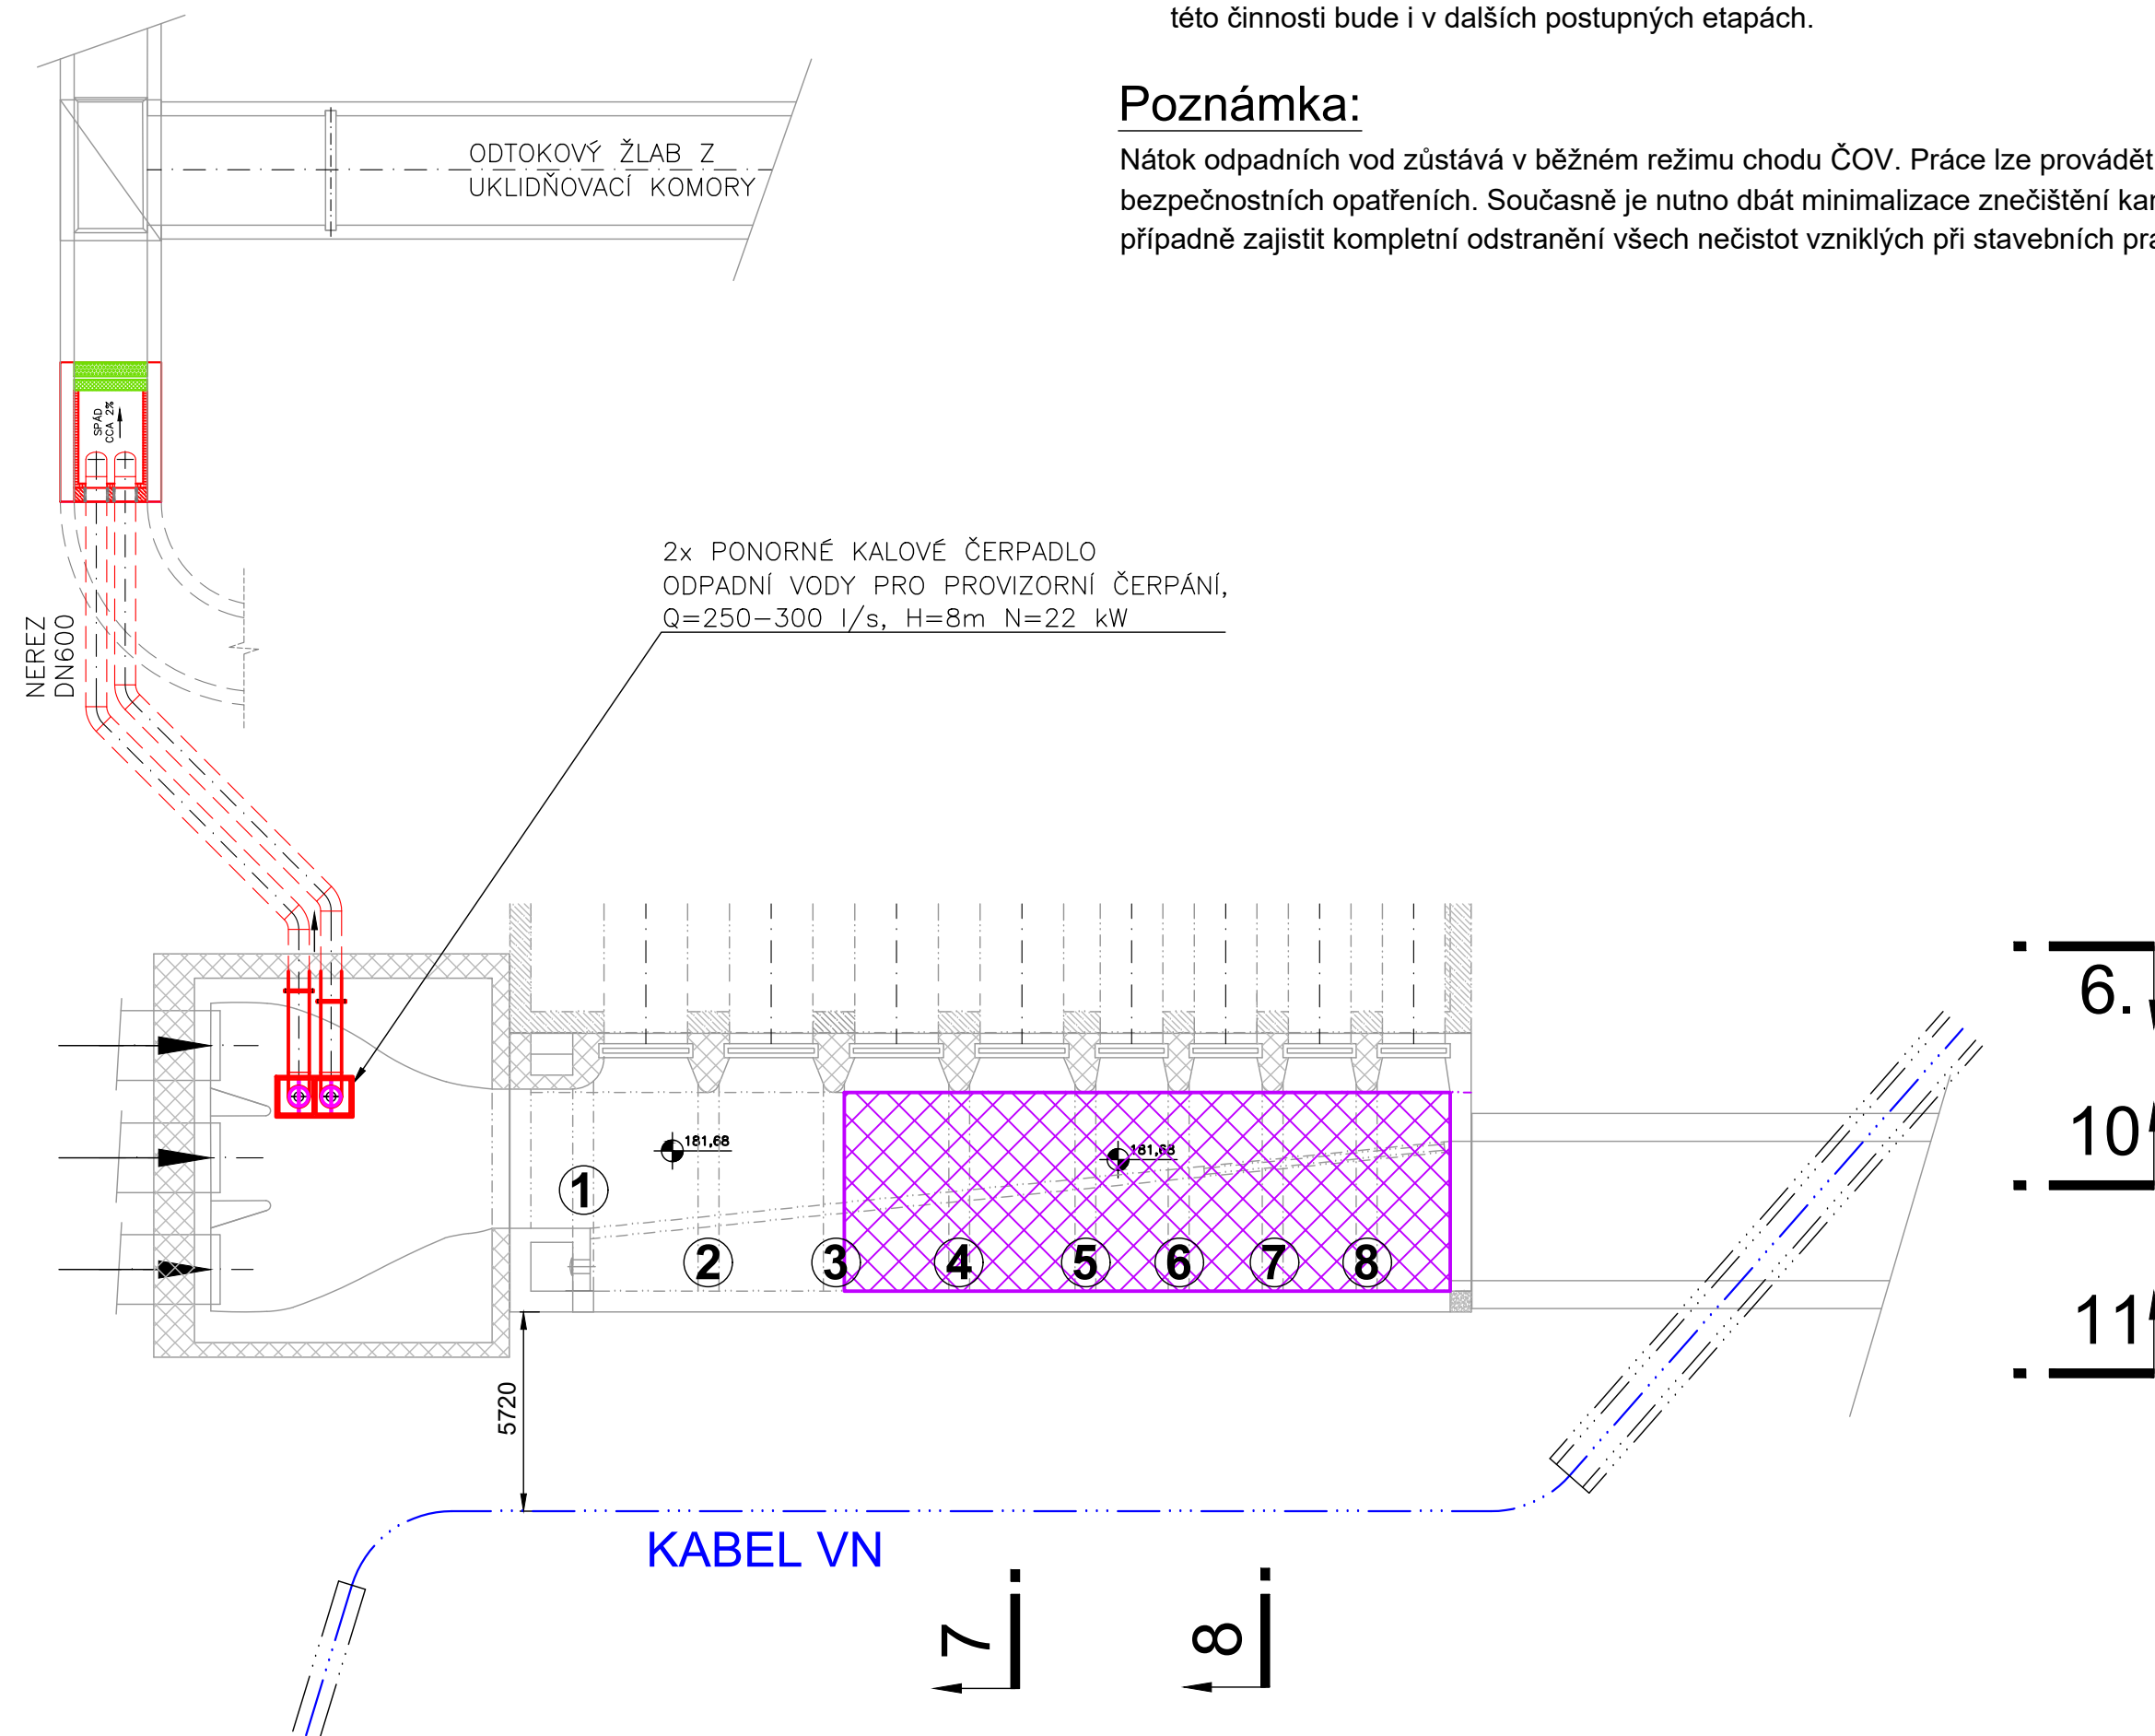

## I.krok úpravy kanálu.

1. Provede se demolicie stropních panelů nad kanálem mezi trámy č.3 až 8. Viz označení na výkrese.
2. Bude započato s realizací provizorního čerpání natékající odpadní vody na HČS. Pokračování na této činnosti bude i v dalších postupných etapách.

Poznámka:

Nátok odpadních vod zůstává v běžném režimu chodu ČOV. Práce lze provádět za zvýšených bezpečnostních opatřeních. Současně je nutno dbát minimalizace znečištění kanálu stavební sítě, případně zajistit kompletní odstranění všech nečistot vzniklých při stavebních pracích.

LEGENDA:

	RUŠENÉ KONSTRUKCE
	STAVEBNÍ KONSTRUKCE -STÁVAJÍCÍ
	NOVÉ POTRUBNÍ TRASY
	NOVÉ POTRUBNÍ TRASY - PODZEMNÍ
	NOVÁ TECHNOLOGIE
	KABEL ELEKTRO - VYSOKÉ NAPĚTÍ

$$\pm 0,000 = X \text{ m n.m.}$$

Rev. E			
Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú.Bubeneč (730106)

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

 <b>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</b>		Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš PRAGER		Zodp. projektant: Ing. Aleš PRAGER		Vypracoval: Bc. Josef NEKVINDA	
MÚ (OÚ): MÚ Praha 6		Kraj: Hlavní město Praha		Datum: 01/2020	
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1		Stupeň:		ZD	
Zakázka: <b>ÚČOV - doplnění hrubého předčištění před HČS</b> číslo investiční akce 1/2/P31/00 <b>D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b> D.2.1 Strojně-technologická část		Číslo zakázky:		4053/1/2018	
		Měřítko:		1:200	
		Počet formátů A4:		3	Č. kopie:
Obsah: <b>ETAPIZACE VÝSTAVBY - I. ETAPA</b>		Číslo přílohy: <b>D.2.1.6</b>		Revize: -	
